BuildProof

GIDS VOOR INSTALLATEURS

# Is jouw vakwerk vastgelegd voordat de borger belt?

Zeven pijnpunten die elke installateur op de bouw herkent, en hoe je ze oplost zonder extra tijd. Opgeschreven vanaf de werkvloer.

Ventilatie | Loodgieterswerk | Elektra







WAAROM DEZE GIDS

# Het werk is klaar. Nu nog laten zien dat het klaar is.

Op de bouw wordt goed werk geleverd. Waar het misgaat, is daarna: de foto staat op de telefoon van een monteur, het meetrapport ligt in de bus, en de werkvoorbereiding belt rond om te horen wat er af is.

Deze gids is geschreven vanuit een ventilatiebedrijf: monteurs die standleidingen zetten, kanalen leggen en woningen inregelen. Samen met hen hebben we op de bouwplaats opgeschreven waar tijd en geld weglekken. Daarna bleek iets anders: loodgieters en elektriciens herkennen precies dezelfde problemen. Alleen het rapport heet anders.

**Herken je dit?**

- Je zoekt foto's in groepsapps en op telefoons.
- De werkvoorbereiding weet pas aan het eind wat er niet af is.
- Meerwerk wordt gedaan maar niet gefactureerd.
- Rapporten worden 's avonds overgetypt.

**Wat je eraan hebt**

Per pijnpunt lees je hoe het er bij ventilatie, loodgieterswerk en elektra uitziet, wat het kost, en wat je morgen al anders kunt doen. Met of zonder software.

## Inhoud


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Foto's raken kwijt | 3 |
| 2 | Werkvoorbereiding weet niet wat klaar is | 4 |
| 3 | Het bewijs komt pas bij de oplevering | 5 |
| 4 | Meerwerk wordt niet betaald | 6 |
| 5 | Rapporten op papier | 7 |
| 6 | Uren en leverbonnen op briefjes | 8 |
| 7 | Geen bereik, geen werk | 9 |
| | Reken het zelf uit · Checklist · Zo pakken wij het aan | 10 |

PIJNPUNT 1

# Foto's raken kwijt

1

Iedereen maakt foto's. Bijna niemand kan ze een maand later terugvinden bij de juiste woning.

## Zo ziet het eruit

| | |
|---|---|
| **Ventilatie** | De standleiding is dichtgezet voordat iemand de doorvoer heeft vastgelegd. De foto staat ergens in een groepsapp tussen tweehonderd andere. |
| **Loodgieter** | Leidingwerk in de vloer is gestort. Bij een lekkage wil iedereen weten hoe het liep, maar de foto staat op de telefoon van een monteur die al bij een ander project zit. |
| **Elektra** | Inbouwdozen en leidingen in de wand zijn gefotografeerd, maar niet bij welk appartement en welke wand. |

## Wat het kost

**Zoektijd voor de werkvoorbereiding**, discussie bij schade zonder bewijs, en werk dat opnieuw open moet omdat niemand kan laten zien hoe het erin zit.

## Zo los je het op

- **Foto hoort bij een plek.** Leg elke foto vast bij project, woning en onderdeel, op het moment dat je hem maakt. Achteraf sorteren gebeurt nooit, en als het wel gebeurt, kost het je veel kostbare tijd.
- **Fotografeer vóór het dichtgaat.** Spreek per onderdeel af wat er op de foto moet: doorvoer, afschot, bevestiging, isolatie.
- **Iedereen legt zijn eigen werk vast.** Elke monteur maakt met zijn eigen telefoon een foto van wat hij gemaakt heeft en beantwoordt een paar korte vragen. Alles komt op één plek samen.

EERSTE STAP

**Spreek per onderdeel af welke foto je wilt zien, bijvoorbeeld de standleiding met de doorvoer voordat hij dichtgaat. Dan weet elke monteur wat hij moet vastleggen.**

PIJNPUNT 2

# Werkvoorbereiding weet niet wat klaar is

2

De werkvoorbereiding stuurt op gevoel en telefoontjes. Wat er echt af is, blijkt pas als de aannemer belt.

## Zo ziet het eruit

| | |
|---|---|
| **Ventilatie** | We weten dat we zijn begonnen aan de standleidingen, maar niet waar we gebleven zijn. Of dat er misschien al verder is afgemonteerd. |
| **Loodgieter** | Riolering en waterleiding per woning zijn af, op twee na. Welke twee? Daar gaat een ochtend bellen in zitten. |
| **Elektra** | De groepenkasten zijn geplaatst, maar welke zijn al aangesloten en doorgemeten? |

## Wat het kost

**Verkeerd ingeplande mensen**, monteurs die voor niets naar een project rijden, en een aannemer die het vertrouwen verliest omdat je het antwoord niet direct hebt.

## Zo los je het op

- **Klaar is een vinkje, geen gevoel.** Spreek per onderdeel af wanneer het af is, en laat de monteur dat op de plek zelf afvinken.
- **Status per woning, in één oogopslag.** De werkvoorbereiding moet zonder te bellen zien wat open, bezig of klaar is.
- **Werk in volgorde.** Woning voor woning afronden maakt de status betrouwbaar en de planning voorspelbaar.

EERSTE STAP

**Hang per project één overzicht op met alle woningen en onderdelen. Groen is klaar, geel is bezig. Laat de voorman het elke dag bijwerken.**

PIJNPUNT 3

# Het bewijs komt pas bij de oplevering

3

Met de Wet kwaliteitsborging vraagt de kwaliteitsborger aan het eind om bewijs. Wie dat dan pas gaat verzamelen, is te laat.

## Zo ziet het eruit

| | |
|---|---|
| **Ventilatie** | De kwaliteitsborger wil per woning de gemeten luchthoeveelheden en foto's van de brandwerende doorvoeren. De woningen zijn al bewoond. |
| **Loodgieter** | Het afpersen van de waterleiding is gedaan, maar het bewijs is een handgeschreven briefje zonder datum. |
| **Elektra** | De installatie is geïnspecteerd, maar de meetwaarden per groep moeten nog uit een notitieboekje gehaald worden. |

## Wat het kost

**Vertraging bij de oplevering**, terug naar een bewoonde woning om iets aan te tonen, en in het slechtste geval werk dat open moet.

## Zo los je het op

- **Leg bewijs vast tijdens het werk.** Het dossier bouw je op terwijl je bouwt, niet erna.
- **Vraag vooraf wat de kwaliteitsborger wil zien.** Maak daar per onderdeel een korte checklist van.
- **Bewijs is foto plus vinkje plus meting.** Samen, bij dezelfde woning, met datum en naam.

EERSTE STAP

**Vraag bij je volgende project aan de aannemer welke stukken de kwaliteitsborger per installatie verwacht. Zet ze in één lijst en geef die aan de voorman.**

Software legt het bewijs vast. Of een installatie voldoet, beoordeelt de kwaliteitsborger.

PIJNPUNT 4

# Meerwerk wordt niet betaald

4

De bewoner vraagt even een extra afzuigpunt, een extra kraan of een extra wandcontactdoos. Het wordt gedaan. Het wordt nooit gefactureerd.

## Zo ziet het eruit

| | |
|---|---|
| **Ventilatie** | Een extra afvoerpunt in de berging, op verzoek van de bewoner. Eén ventiel en drie meter kanaal, mondeling afgesproken. |
| **Loodgieter** | Een omgelegde afvoer omdat de keuken anders is geplaatst dan op tekening. Niemand heeft het opgeschreven. |
| **Elektra** | Twee extra groepen voor een laadpaal en een warmtepomp. De monteur weet het nog, de werkvoorbereiding niet. |

## Wat het kost

**Omzet die je al verdiend hebt** en toch misloopt. En discussie achteraf, omdat niemand kan laten zien wat er is afgesproken.

## Zo los je het op

- **Meerwerk ter plekke vastleggen.** Foto, korte omschrijving en woning, op het moment dat het gevraagd wordt.
- **Direct naar de werkvoorbereiding.** De werkvoorbereiding kan dan meteen akkoord vragen aan de aannemer of bewoner.
- **Geen akkoord, geen meerwerk.** Spreek dat af met je monteurs, en geef ze de middelen om het in een minuut te regelen.

EERSTE STAP

**Geef elke monteur één vaste plek om meerwerk te melden, en bespreek die meldingen elke vrijdag met de werkvoorbereiding voordat er gefactureerd wordt.**

PIJNPUNT 5

# Rapporten op papier

5

Elk vak heeft zijn eigen rapport. Ze hebben één ding gemeen: ze worden op de bouw ingevuld en door de werkvoorbereiding overgetypt.

| VAK | RAPPORT | WAT ER MISGAAT |
|---|---|---|
| **Ventilatie** | Inregelrapport per woning: luchthoeveelheden per ruimte, stand van de unit | Waarden worden overgetypt, ruimtes verwisseld, rapporten raken kwijt |
| **Loodgieter** | Afpersrapport en druktest van water en gas | Datum, druk en duur ontbreken of zijn niet te lezen |
| **Elektra** | Inspectierapport en meetwaarden per groep | Meetwaarden staan in een notitieboekje, niet bij de installatie |

## Wat het kost

**Avonden typwerk**, fouten bij het overnemen, en een rapport dat er pas weken na het werk is.

## Zo los je het op

- **Invullen waar je meet.** Het rapport wordt ingevuld op de plek waar de waarde gemeten wordt, één keer.
- **Het rapport maakt zichzelf.** Wat de monteur invult, is meteen het rapport voor de klant en voor het dossier.
- **Controle bij het invullen.** Een waarde die afwijkt van wat er hoort, valt op terwijl de monteur er nog staat.

EERSTE STAP

**Leg je rapporten naast elkaar en schrap elk veld dat de werkvoorbereiding nu dubbel invult. Wat overblijft, is wat de monteur op de bouw moet vastleggen.**

PIJNPUNT 6

# Uren en leverbonnen op briefjes

6

Aan het eind van de week moet de werkvoorbereiding uitzoeken wie waar heeft gewerkt en wat er geleverd is. Uit briefjes, appjes en geheugen.

## Zo ziet het eruit

| | |
|---|---|
| **Ventilatie** | Een vracht kanalen en bochten is afgeleverd op de bouw. De bon ligt in de bus, de handtekening ontbreekt. |
| **Loodgieter** | Uren worden vrijdagmiddag uit het hoofd ingevuld. Twee projecten op één dag worden één project. |
| **Elektra** | Er mist kabel op de bouw. Niemand weet of die nooit geleverd is of al verwerkt. |

## Wat het kost

**Uren die niet op het juiste project staan**, materiaal dat dubbel besteld wordt, en discussie met de leverancier zonder bewijs van levering.

## Zo los je het op

- **Uren elke dag, per project.** Kort invullen aan het eind van de dag gaat sneller en klopt beter dan een week later.
- **Leverbon met foto en handtekening.** Op de bouw vastgelegd, bij het juiste project, op het moment van leveren.
- **Werkvoorbereiding controleert, typt niet.** Wat op de bouw is vastgelegd, hoeft de werkvoorbereiding niet opnieuw in te voeren.

EERSTE STAP

**Spreek af dat elke leverbon op de dag van levering gefotografeerd en doorgestuurd wordt, met projectnaam in het bericht.**

PIJNPUNT 7

# Geen bereik, geen werk

7

In de kelder, de schacht of de technische ruimte is geen bereik. Juist daar zit het werk dat je wilt vastleggen.

## Zo ziet het eruit

| | |
|---|---|
| **Ventilatie** | De unit staat op zolder, onder een betonnen dak. De foto's worden niet verzonden, en daarna wordt vergeten ze opnieuw te versturen. |
| **Loodgieter** | De meterkast en de kruipruimte: geen signaal. Het vastleggen wordt uitgesteld tot boven. |
| **Elektra** | In de parkeerkelder hangt de hoofdverdeler. Meetwaarden worden op papier gezet omdat de telefoon niets verstuurt. |

## Wat het kost

**Vastleggen dat niet gebeurt**, omdat het op dat moment niet lukt. Elk gat in het bewijs begint hier.

## Zo los je het op

- **Vastleggen moet altijd kunnen.** Met of zonder bereik: opslaan op de telefoon en versturen zodra er weer signaal is.
- **Niets mag verloren gaan.** Een monteur moet erop kunnen vertrouwen dat wat hij vastlegt, aankomt.
- **Test het in de kelder.** Kies geen werkwijze of software zonder hem op de slechtste plek van de bouw te proberen.

EERSTE STAP

**Vraag je monteurs waar op hun projecten geen bereik is. Dat zijn precies de plekken waar je bewijs nu ontbreekt.**

REKEN HET ZELF UIT

# Hoeveel tijd lekt er bij jou weg?

Bij een installatiebedrijf gaat er bij de werkvoorbereiding al snel 20 uur per week verloren aan zoeken, bellen en overtypen. Vul je eigen getallen ernaast in.

| WAAR GAAT TIJD NAARTOE (UUR PER WEEK) | PRAKTIJK | JOUW BEDRIJF |
|---|---|---|
| Foto's uitzoeken en in mappen zetten | 6 | |
| Rondbellen wat er klaar is | 4 | |
| Urenstaten overtypen en controleren | 3 | |
| Checklists en rapporten nalopen en overtypen | 3 | |
| Meerwerk achterhalen en doorzetten naar facturatie | 2 | |
| Leverbonnen zoeken en bij het project zetten | 2 | |
| **Totaal per week** | **20** | |

Totaal per week × 46 weken × uurtarief **= wat het je per jaar kost**

CHECKLIST

## Hoe staat jouw bedrijf ervoor?

- [ ] Elke foto is binnen een minuut terug te vinden bij woning en onderdeel.
- [ ] De werkvoorbereiding ziet zonder te bellen wat er per woning klaar is.
- [ ] We weten vooraf welk bewijs de kwaliteitsborger per installatie wil zien.
- [ ] Meerwerk wordt vastgelegd op het moment dat het gevraagd wordt.
- [ ] Rapporten worden één keer ingevuld, op de plek waar gemeten wordt.
- [ ] Uren staan elke dag op het juiste project.
- [ ] Elke leverbon heeft een foto en een handtekening.
- [ ] Monteurs kunnen ook zonder bereik alles vastleggen.

**7 of 8 vinkjes**
Je bewijs is op orde. Houd het zo.

**4 tot 6 vinkjes**
Er lekt tijd weg. Begin bij het pijnpunt dat het meest kost.

**3 of minder**
Elke oplevering is een gok. Begin morgen met pijnpunt 1.




ZO PAKKEN WIJ HET AAN

# Gebouwd vanaf de werkvloer, niet vanachter een bureau.

BuildProof is ontstaan op de bouwplaats van een ventilatiebedrijf. Elke monteur legt zijn eigen werk vast met een foto en een paar korte vragen, ook zonder bereik. De werkvoorbereiding ziet meteen wat er per appartement klaar is.

- **Minder zoeken.** Foto's, checklists en rapporten staan bij het juiste appartement.
- **Minder bellen.** De werkvoorbereiding ziet wat klaar is zonder rond te vragen.
- **Meerwerk betaald.** Vastgelegd op het moment dat het gevraagd wordt.
- **Bewijs klaar.** Voor de aannemer, de bewoner en de kwaliteitsborger.

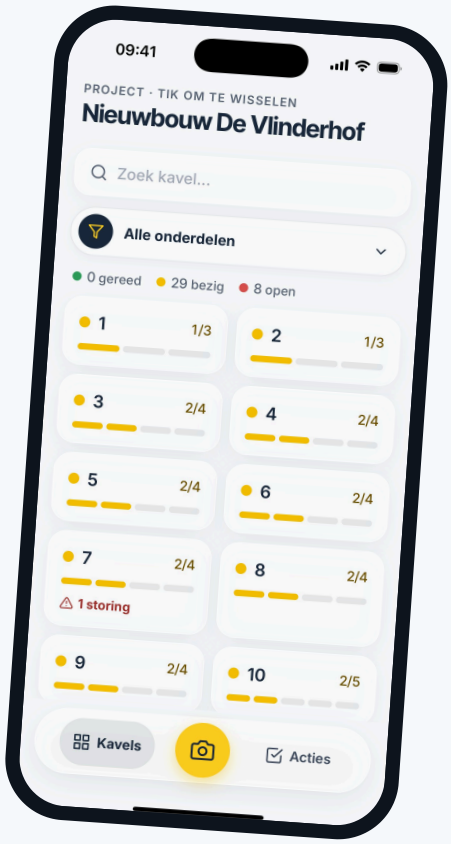


## Benieuwd hoe het werkt op jouw bouw?

Plan een kennismaking

buildproof.nl · info@buildproof.nl

BuildProof

ELKE STAP OP DE BOUW, BEWEZEN.
